

PRODUKTIONSPLANUNG · ANLEITUNG

Anleitung Konfektion

Abteilungsleitung und Stellvertretung · Konfektion 1, 2 und 3

FÜR WEN

Abteilungsleitung und Stellvertretung Konfektion. Lesende Konten des Bereichs sehen dieselben Ansichten ohne Bearbeitung.

Inhalt

1. Grundlagen: Anmelden, Speichern, Meldungen
2. Ihr Bereich im Überblick
3. Wochenplan
4. Auftragsliste und Priorität
5. Freigeben
6. Produktion melden
7. Personal
8. System: Maschinen, Kalender, Benutzer
9. Begriffe
10. Häufige Meldungen und Hilfe

1. Grundlagen: Anmelden, Speichern, Meldungen

Die Produktionsplanung läuft im Browser (Edge, Chrome oder Firefox). Auf dem PC muss nichts installiert werden.

- 1 Browser öffnen und die Adresse eingeben, die der Admin nennt, z. B. **http://192.168.10.89:8765**.
 - 2 Benutzername und Passwort eingeben, .
 - 3 Oben rechts stehen Ihr Name und Ihre Rolle. Links sehen Sie nur die Bereiche, die Ihre Rolle nutzen darf.
- **Passwort ändern:** oben rechts , aktuelles und zweimal das neue Passwort (mind. 8 Zeichen). Andere angemeldete Geräte dieses Kontos werden dabei abgemeldet.
 - **Abmelden:** oben rechts . An gemeinsam genutzten PCs immer abmelden – dabei werden die im Browser zwischengespeicherten Daten gelöscht.
 - **Speichern:** Jede Änderung wird sofort auf dem Server gespeichert. Unten links steht dann „Server gespeichert“.
 - **Mehrere Benutzer gleichzeitig:** Änderungen anderer erscheinen nach wenigen Sekunden automatisch. Haben zwei Personen gleichzeitig gespeichert, gleicht das Programm ab und meldet sich, falls das nicht möglich ist.

WICHTIG

Fehlermeldungen bestehen aus Klartext und einem Code, z. B.

MP-PLAN-031

. Bei Rückfragen immer Code, Auftrag (FS/AB) und Uhrzeit nennen. Meldung „Client-Version veraltet“ (MP-SYNC-002): die Seite mit + neu laden.

TIPP

Nach 8 falschen Passwörtern ist die Anmeldung von diesem PC für 10 Minuten gesperrt.

2. Ihr Bereich im Überblick

Als **Abteilungsleitung** oder **Stellvertretung Konfektion** planen Sie den eigenen Bereich fein, geben Aufträge frei, melden die Produktion (Start, Pause, Fertig) und planen Ihr Personal. Die Aufträge (FS) mit AV-Termin legt die Arbeitsvorbereitung an.

Aufgabe	Wo?	Wer?
Aufträge fein planen, Reihenfolge festlegen	Planung → Wochenplan / Aufträge	Leitung, Stellvertretung
Freigeben / Freigabe zurücknehmen	Aufträge (▶ / ◀)	Leitung, Stellvertretung
Start, Pause, Fertig, Abbruch	oben Produktion	Leitung, Stellvertretung
Personal einteilen, Urlaub/Krankheit	Personal	Leitung, Stellvertretung
Leiharbeiter anfragen	Personal → Mitarbeiter	Leitung, Stellvertretung → GF genehmigt
Maschinen/Linien, Schichtkalender, Stillstand	System	Leitung, Stellvertretung
Benutzer für den Bereich	System → Benutzer	Leitung: Stellvertretung + Lesende · Stellvertretung: Lesende
AV-Termin, neue FS anlegen	–	Arbeitsvorbereitung
Feiertage / Betriebsferien	–	GF, Admin

TIPP

Ein typischer Tag: Wochenplan prüfen (rote Karten zuerst) → Personal der Woche kontrollieren → nächste Aufträge freigeben → in der Produktion starten und am Ende fertig melden.

Besonderheiten Konfektion 1, 2 und 3

- Jede Konfektion plant auf einer **Linie**. Die Sollstunden sind **Personenstunden**.
- $\text{Durchlaufzeit} = \text{Sollstunden} \div \text{Besetzung}$. Beispiel: 40 h bei 4 Personen = 10 h im Wochenplan.
- Die Besetzung pflegen Sie unter System → Maschinen & Linien (Spalte „Besetzung“). Sie wird bei der Freigabe eingefroren.
- Mehr Personal für eine Woche? Leiharbeiter anfragen (Kapitel Personal) oder die GF setzt Mitarbeiter anderer Bereiche per KW-Einsatz ein.

Produktionsplanung

V12.7.5 · Bereiche · Personal

Wochenplan

Konfektion 1 – Thomsen · Maschinen & Linien · AV-Termine

lead_k1 Abteilungsleiter LAN
+ Auftrag

Planung

Produktion

☰ Planung

☷ Aufträge

☷ Projekte

👤 Personal

⚙ System

AKTIVE AUFTRÄGE

1

geplant · freigegeben · laufend

OFFENE SOLLSTUNDEN

6,5 h

alle offenen Aufträge

IN PRODUKTION

0

laufend / pausiert

TERMIN GEFÄHRDET

0

AV-Termin überschritten / nicht planbar

AUSLASTUNG KW

16%

6,5 von 40 h belegt

☐ geplant
☒ freigegeben
☐ läuft
☐ pausiert
☐ AV-Termin überschritten
☐ fertig

KW 40

<

09/28/2026

>

Heute

 PDF

Linie	Mo 28.09.	Di 29.09.	Mi 30.09.	Do 01.10.	Fr 02.10.	Sa 03.10.	So 04.10.
Linie Konfektion 1 – Thomsen 1 Auftr. · 1-schichtig · 1 Pers.			FS-26-5118 AB-26-304 · WT-704 Mi, 30.09., 11:01 → Do, 01.10., 08:31 - 6.5 h Pers. AV bis 11.10. Termin	↳ FS-26-5118 AB-26-304 · WT-704			

Projekt-Aufgaben für diesen Bereich

Aus Projekten zugewiesene Aufgaben. „Als Auftrag einplanen“ legt den Fertigungsauftrag im Wochenplan an.

PROJEKT	ABTEILUNG	AUFGABE	TERMIN	STATUS	FERTIGUNG
AB-26-302 · WT-702 · Krones An Produktion übergeben	Konfektion 1 – Thomsen	Konfektion	12.10. – 16.10.	Offen	▼ Als Auftrag einplanen
AB-26-303 · WT-703 · Trumpf An Produktion übergeben	Konfektion 1 – Thomsen	Konfektion	12.10. – 16.10.	Offen	▼ Als Auftrag einplanen
AB-26-304 · WT-704 · Voith An Produktion übergeben	Konfektion 1 – Thomsen	Konfektion	12.10. – 16.10.	Offen	▼ Als Auftrag einplanen
AB-26-305 · WT-705 · Liebherr An Produktion übergeben	Konfektion 1 – Thomsen	Konfektion	12.10. – 16.10.	Offen	▼ Als Auftrag einplanen

● Server gespeichert
 Zentraler Server · Rev. 7

Wochenplan Konfektion – Zeilen = Linien, Spalten = Tage der KW

- Mit   oder dem Datumsfeld die Woche wechseln,  springt zur aktuellen Woche.  PDF druckt den Wochen-Auftragsplan.
- Jede Karte ist ein Auftrag mit FS, AB/WT, Zeitraum, Sollstunden und AV-Termin („AV bis ...“). Läuft ein Auftrag über mehrere Tage, ist nur die Karte am ersten Tag verschiebbar; Folgetage sind gestrichelt (↘).
- Farben: blau = geplant, dunkelblau = freigegeben, gelb = läuft, violett = pausiert, grün = fertig. **Rot umrandet = AV-Termin wird überschritten**; oben erscheint dann eine Liste zum Anklicken.
- Kacheln oben: aktive Aufträge, offene Sollstunden, in Produktion, Termin gefährdet, Auslastung der KW.

Termin ändern (Feinplanung)

- 1 Karte auf einen anderen Tag bzw. eine andere Maschine ziehen – oder auf der Karte **Termin** klicken.
- 2 Planart wählen: **Automatik** (frühestmöglich), **Startwunsch / Start fix** oder **Fertig bis Wunsch / fix** (rückwärts).
- 3 **Vorschau** zeigt ALT und NEU und die Auswirkungen auf andere Aufträge. Erst **Änderung übernehmen** speichert.

WICHTIG

Früher als der AV-Termin planen ist immer erlaubt, später nicht (MP-PLAN-062). Den AV-Termin selbst ändert nur die Arbeitsvorbereitung.

Projekt-Aufgaben für Ihren Bereich

Projekt-Aufgaben für diesen Bereich

Aus Projekten zugewiesene Aufgaben. „Als Auftrag einplanen“ legt den Fertigungsauftrag im Wochenplan an.

PROJEKT	ABTEILUNG	AUFGABE	TERMIN	STATUS	FERTIGUNG
AB-26-302 · WT-702 · Krones An Produktion übergeben	Konfektion 1 - Thomsen	Konfektion	12.10. - 16.10.	Offen	▼ Als Auftrag einplanen
AB-26-303 · WT-703 · Trumpf An Produktion übergeben	Konfektion 1 - Thomsen	Konfektion	12.10. - 16.10.	Offen	▼ Als Auftrag einplanen
AB-26-304 · WT-704 · Voith An Produktion übergeben	Konfektion 1 - Thomsen	Konfektion	12.10. - 16.10.	Offen	▼ Als Auftrag einplanen
AB-26-305 · WT-705 · Liebherr An Produktion übergeben	Konfektion 1 - Thomsen	Konfektion	12.10. - 16.10.	Offen	▼ Als Auftrag einplanen

Unter dem Wochenplan: Aufgaben aus Projekten für Ihren Bereich

- Hier stehen Aufgaben, die das Projektmanagement oder die AV Ihrem Bereich zugewiesen hat, mit Zeitraum.
- Status selbst melden: **Offen** → **In Arbeit** → **Wartet** → **Erledigt** (oder Entfällt).
- **Als Auftrag einplanen** legt dazu eine FS im Wochenplan an; die Aufgabe bleibt mit der FS verknüpft.

4. Auftragsliste und Priorität

Produktionsplanung
V12.7.5 · Bereiche · Personal

Planung **Produktion**

Planung
Aufträge
Projekte
Personal
System

Aufträge
Konfektion 1 - Thomsen · Priorität per Ziehen oder ↑/↓ · AV-Termin

lead_k1 Abteilungsleiter LAN

Auftragsliste
Reihenfolge = Priorität (ziehen oder ↑/↓). Rot = AV-Termin wird überschritten.

← Projekte + Neuer Auftrag

Auftrag suchen ... Alle Maschinen / Linien Alle Status ☐ nur Konflikte

	PRIOR	AUFTRAG	MASCHINE / LINIE	SOLL H	MENGE	AV-TERMIN	PLAN	STATUS	AKTION
...	#18	FS-26-5118 AB-26-304 · WT-704 Grundplatte Alu	Linie Konfektion	6.5	120	10/11/2026	Mi., 30.09., 11:01 bis Do., 01.10., 08:31	Geplant	

Server gespeichert
Zentraler Server · Rev. 7
V12.7.5 · CNC + Konfektion +
Siebdruck + Tiefziehen · zentraler
LAN-Stand.


Planung → Aufträge: dieselben Aufträge als Liste

- Die Reihenfolge ist die **Priorität**: Zeile am Griff ziehen oder mit / verschieben.
- Direkt in der Zeile änderbar: Maschine, Alternative Maschine, Sollstunden, Menge. Suche und Filter oben.
- Spalte Aktion: Termin planen · Freigeben · Freigabe zurücknehmen · Löschen (nur geplante Aufträge).
- Mit **+ Neuer Auftrag** können Sie selbst eine FS anlegen (z. B. Muster). In der Regel legt die AV die Aufträge an.

5. Freigeben

Die Freigabe friert den Plan des Auftrags ein. Danach kann die Produktion starten.

- 1 Planung → Aufträge, beim gewünschten Auftrag  (Freigeben).
- 2 Der Server prüft: liegt der Plan in der Schicht, außerhalb von Pausen, Sperrzeiten und anderen festen Aufträgen, und (bei Personal-Gate EIN) ist genug Personal eingeteilt?
- 3 Status wird „Freigegeben“, die Zeile ist gesperrt (🔒).

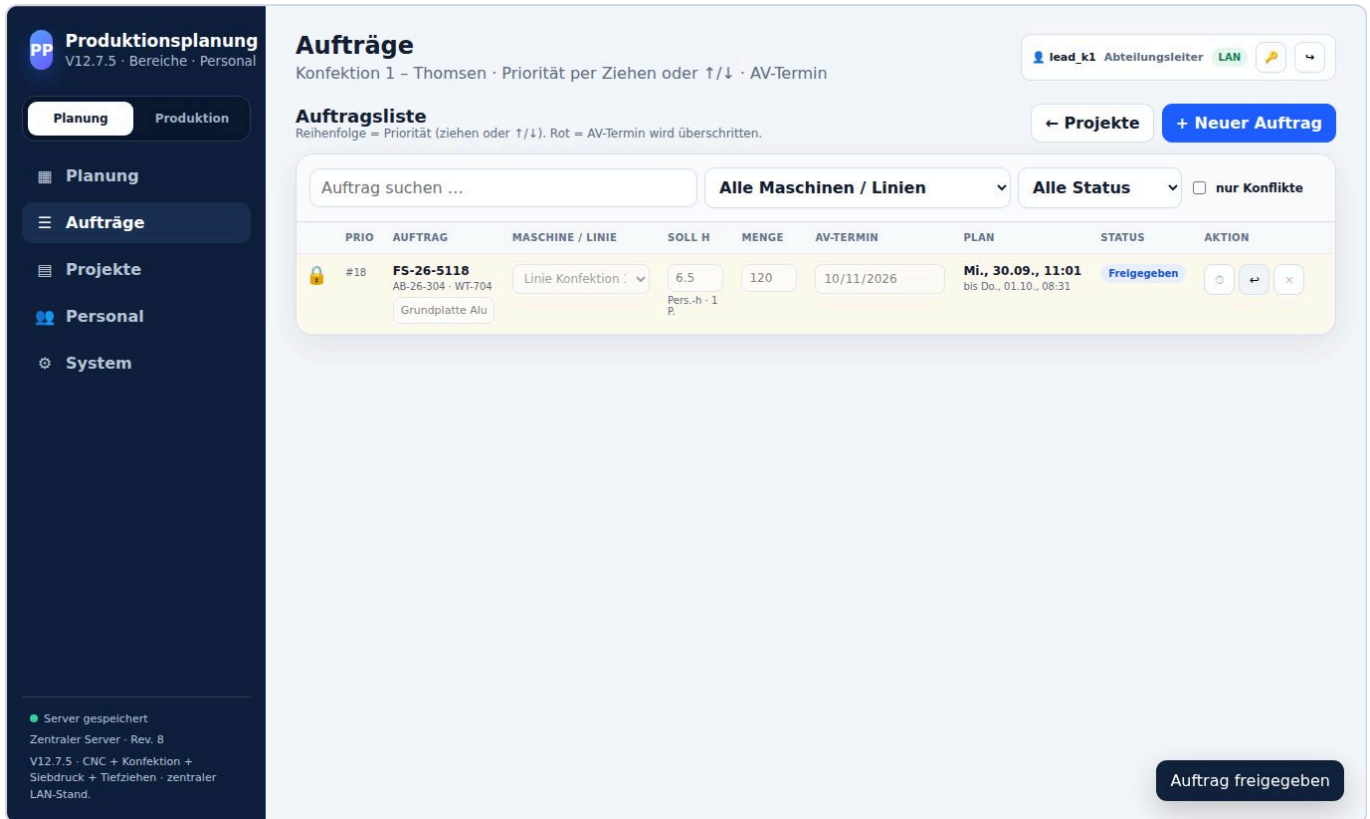

Produktionsplanung
V12.7.5 · Bereiche · Personal

Aufträge
Konfektion 1 - Thomsen · Priorität per Ziehen oder ↑/↓ · AV-Termin

Auftragsliste
Reihenfolge = Priorität (ziehen oder ↑/↓). Rot = AV-Termin wird überschritten.

Auftrag suchen ... **Alle Maschinen / Linien** **Alle Status** ☐ nur Konflikte

PRIOR	AUFTRAG	MASCHINE / LINIE	SOLL H	MENGE	AV-TERMIN	PLAN	STATUS	AKTION
🔒 #18	FS-26-5118 AB-26-304 · WT-704 Grundplatte Alu	Linie Konfektion : ▾	6.5	120	10/11/2026	Mi., 30.09., 11:01 bis Do., 01.10., 08:31	Freigegeben	  

Server gespeichert
Zentraler Server · Rev. 8
V12.7.5 · CNC + Konfektion +
Siebdruck + Tiefziehen · zentraler
LAN-Stand.

Auftrag freigegeben

Freigegebener Auftrag: Zeile gesperrt, Aktion  nimmt die Freigabe zurück

WICHTIG

Ändern geht nach der Freigabe nicht mehr. Erst  Freigabe zurücknehmen, dann umplanen und neu freigeben.

6. Produktion melden

Oben links auf **Produktion** umschalten. Je Maschine bzw. Linie sehen Sie den aktuellen Auftrag und die Warteschlange der freigegebenen Aufträge.

Produktionsplanung
V12.7.5 · Bereiche · Personal

Planung **Produktion**

Produktion

Aufträge

Projekte

Personal

System

Produktion
Konfektion 1 - Thomsen · Start · Pause · Fortschritt · Fertigmeldung

lead_k1 Abteilungsleiter LAN

Neu berechnen

Nur Start, Pause, Fortschritt und Fertigmeldung - geplant wird im Wochenplan.

FREIGEgeben
1

LAUFEND
0

PAUSIERT
0

KONFLIKT / TERMIN
GEFÄHRDET
0

Linie Konfektion 1 - Thomsen · 1 Pers. Bereit

FS-26-5118 · AB-26-304 · WT-704

Nächster freigegebener Auftrag · Mi., 30.09., 11:01 → Do., 01.10., 08:31 · Menge 120 / Plan 123

Freigegebener Planstand ist fixiert.

Produktion starten

WARTESCHLANGE
Keine weiteren freigegebenen Aufträge.

Server gespeichert
Zentraler Server · Rev. 8
V12.7.5 · CNC + Konfektion + Siebdruck + Tiefziehen · zentraler LAN-Stand.

Produktionsansicht vor dem Start

Starten

- 1 Beim nächsten Auftrag **Produktion starten**. Das geht nur während der Arbeitszeit der Maschine und nicht deutlich vor dem geplanten Start.
- 2 Die Karte wird gelb („In Produktion“).

PP

Produktionsplanung

V12.7.5 · Bereiche · Personal

Planung

Produktion

► Produktion

≡ Aufträge

≡ Projekte

≡ Personal

⚙ System

● Server gespeichert

Zentraler Server · Rev. 9

V12.7.5 · CNC + Konfektion + Siebdruck + Tiefziehen · zentraler LAN-Stand.

Produktion

Konfektion 1 – Thomsen · Start · Pause · Fortschritt · Fertigmeldung

lead_k1 Abteilungsleiter LAN

Neu berechnen

FREIGEgeben

0

LAUFEND

1

PAUSIERT

0

KONFLIKT / TERMIN GEFÄHRDET

0

Linie Konfektion 1 – Thomsen · 1 Pers.

In Produktion

FS-26-5118

In Produktion · Planende Do., 01.10., 08:31 · Menge 120 / Plan 123

Gut

Ausschuss

Rest h (Korrektur)

0

0

6.50

Pause

Fertig

Abbrechen

WARTESCHLANGE

Keine weiteren freigegebenen Aufträge.

Produktion gestartet

Laufender Auftrag mit Gut, Ausschuss und Rest-Stunden

Während der Produktion

- **Gut / Ausschuss** laufend eintragen (optional, am Ende Pflicht).
- **Rest h (Korrektur)**: Dauert es länger oder kürzer, die Reststunden anpassen – der Plan der folgenden Aufträge rechnet neu.
- **Pause** unterbricht (z. B. Störung), **Fortsetzen** läuft weiter. Die Pause wird in der Historie festgehalten.

PP

Produktionsplanung

V12.7.5 · Bereiche · Personal

Planung

Produktion

► Produktion

≡ Aufträge

≡ Projekte

≡ Personal

⚙ System

● Server gespeichert

Zentraler Server · Rev. 10

V12.7.5 · CNC + Konfektion + Siebdruck + Tiefziehen · zentraler LAN-Stand.

Produktion

Konfektion 1 – Thomsen · Start · Pause · Fortschritt · Fertigmeldung

lead_k1 Abteilungsleiter LAN

Neu berechnen

FREIGEgeben

0

LAUFEND

0

PAUSIERT

1

KONFLIKT / TERMIN GEFÄHRDET

0

Linie Konfektion 1 – Thomsen · 1 Pers.

Pausiert

FS-26-5118

Pausiert · Planende Do., 01.10., 08:31 · Menge 120 / Plan 123

Gut

Ausschuss

Rest h (Korrektur)

0

0

6.50

Fortsetzen

Fertig

Abbrechen

WARTESCHLANGE

Keine weiteren freigegebenen Aufträge.

Produktion pausiert

Pausierter Auftrag

Fertig melden

- 1 **Fertig** klicken.

- 2 Ist-Start und Ist-Fertig prüfen, **Gutmenge** und **Ausschuss** eintragen.
- 3 Fertig archivieren – der Auftrag wandert mit Ist-Zeiten in die Historie und fließt in Report und Nachkalkulation ein.

Auftrag fertigmelden

Auftrag
FS-26-5118

Ist-Start: 09/30/2026, 11:01 AM

Ist-Fertig: 09/30/2026, 11:01 AM

Gutmenge: 0

Ausschuss: 0

Abbrechen Fertig archivieren

Dialog Fertigmeldung

Abbrechen

Abbrechen beendet einen laufenden Auftrag ohne Fertigmeldung. Ein **Grund ist Pflicht**; der Abbruch steht mit Grund in der Historie.

WICHTIG

Fertig gemeldete und abgebrochene Aufträge lassen sich nicht mehr ändern (die Historie ist unveränderlich). Soll derselbe Auftrag erneut laufen: in der Historie Als neuen Auftrag.

7. Personal

Unter **Personal** planen Sie, wer wann an welcher Maschine bzw. Linie arbeitet.

Wochenplan Personal

PP

Produktionsplanung
V12.7.5 · Bereiche · Personal

Planung

Produktion

Planung

Aufträge

Projekte

Personal

System

Server gespeichert
Zentraler Server · Rev. 12
V12.7.5 · CNC + Konfektion +
Siebdruck + Tiefziehen · zentraler
LAN-Stand.

Personalplanung
Festangestellte · Leiharbeiter · Bereiche · Schichtbesetzung

lead_k1 Abteilungsleiter LAN

KW 40 < Heute >

AKTIVE MITARBEITER
4

ZUORDNUNGEN WOCHE
5

UNTERBESETZTE SCHICHTEN
10

PERSONAL-GATE
AUS
AUS = nur Planung / EIN = harte
Ressource

Wochenplan

Mitarbeiter 4

Abwesenheit

MITARBEITER	MO 28.09.	DI 29.09.	MI 30.09.	DO 01.10.	FR 02.10.
Frank Otto Fest 0,0 h netto	Frei	Frei	Frei	Frei	Frei
Gina Wolf Fest 40,0 h netto	Linie Konfektion 1 06:30-16:00 · 8,8 h %	Linie Konfektion 1 06:30-16:00 · 8,8 h %	Linie Konfektion 1 06:30-16:00 · 8,8 h %	Linie Konfektion 1 06:30-16:00 · 8,8 h %	Linie Konfektion 1 06:30-11:45 · 5 h %
Hans Berg Fest 0,0 h netto	Frei	Frei	Frei	Frei	Frei
Leih: Olga Brandt Leih 0,0 h netto	Frei	Frei	Frei	Frei	Frei

✓ Alle Schichten besetzt Mindestbesetzung: System → Maschinen & Linien, Spalte „Personal/Schicht“

Personal → Wochenplan: je Mitarbeiter und Tag Maschine und Schicht

- Je Mitarbeiter und Tag im Auswahlfeld Maschine/Linie + Schicht wählen, oder **Frei** / eine Abwesenheit.
- Mit  unter der Zuordnung Arbeitszeit und Pausen anpassen.
- Die Kachel **Unterbesetzte Schichten** und die rote Leiste unten zeigen, wo die Mindestbesetzung (System → Spalte „Personal/Schicht“) nicht erreicht ist.
- Mitarbeiter mit Stammmaschine sind automatisch eingeplant.

Mitarbeiter anlegen und pflegen

Produktionsplanung
V12.7.5 · Bereiche · Personal

Personalplanung
Festangestellte · Leiharbeiter · Bereiche · Schichtbesetzung

Mitarbeiter je Tag einer Maschine/Linie und Schicht zuordnen. Zeiten und Pausen über % anpassen.

AKTIVE MITARBEITER
4

ZUORDNUNGEN WOCHE
5

UNTERBESETZTE SCHICHTEN
10

PERSONAL-GATE
AUS
AUS = nur Planung / EIN = harte Ressource

Wochenplan **Mitarbeiter** 4 **Abwesenheit**

+ Mitarbeiter anlegen

Frank Otto
ohne Funktion · Fest · Stamm Konfektion 1 - Thomsen · 40 h/W
Heute · frei · KW 40: 0,0 h

Gina Wolf
ohne Funktion · Fest · Stamm Konfektion 1 - Thomsen · 40 h/W
Heute · Linie Konfektion 1 - Thomsen · 1-Schicht · 06:30-16:00 · Stamm · Pause 09:00-09:15 + 12:00-12:30 · KW 40: 40,0 h

Hans Berg
ohne Funktion · Fest · Stamm Konfektion 1 - Thomsen · 40 h/W
Heute · frei · KW 40: 0,0 h

Leih: Olga Brandt
ohne Funktion · Leih · 05.10.-23.10. - angefragt · Stamm Konfektion 1 - Thomsen · 40 h/W
Einsatz: 10/05/2026 bis
10/23/2026
Heute · frei · KW 40: 0,0 h

Personal → Mitarbeiter

- 1 **+ Mitarbeiter anlegen** öffnen: Name, Funktion, Typ (Festangestellt/Leiharbeiter), Stammabteilung, Wochenstunden.
- 2 Stammmaschine/-linie und Stammschicht (Automatisch, Früh, Spät) wählen.
- 3 Bei **Freigaben** alle Maschinen/Linien anhängen, die die Person bedienen darf – nur dort kann sie eingeteilt werden.

Leiharbeiter anfragen

- 1 Beim Anlegen Typ **Leiharbeiter** wählen und den **Zeitraum** (von–bis) eintragen.
- 2 Der Knopf heißt dann **Leiharbeiter anfragen**. Die Anfrage geht an die GF.
- 3 Erst nach Genehmigung der GF und nur im Zeitraum zählt die Person in Planung und Kapazität. Ein geänderter Zeitraum muss neu angefragt werden.

Urlaub, Krankheit, Sonstiges

Produktionsplanung
V12.7.5 · Bereiche · Personal

Personalplanung
Festangestellte · Leiharbeiter · Bereiche · Schichtbesetzung

lead_k1 Abteilungsleiter LAN

KW 40 Heute

Mitarbeiter je Tag einer Maschine/Linie und Schicht zuordnen. Zeiten und Pausen über % anpassen.

AKTIVE MITARBEITER
4

ZUORDNUNGEN WOCHE
5

UNTERBESETZTE SCHICHTEN
10

PERSONAL-GATE
AUS
AUS = nur Planung / EIN = harte Ressource

Wochenplan Mitarbeiter 4 Abwesenheit

Urlaub & Krankheit
Nur Abteilungsleitung und Stellvertretung. Die GF sieht Abwesenheiten und die Auswirkung auf die Produktion.

Mitarbeiter Art Von Bis

Frank Otto Urlaub 09/30/2026 09/30/2026 **Eintragen**

Gina Wolf **Krank**
06.10. · 1 Arbeitstag(e) · Konfektion 1 – Thomsen

Auswirkung auf die Produktion
Personal-Gate ist AUS: Abwesenheiten verschieben keine Aufträge (nur Anzeige der Unterbesetzung im Wochenplan).

Server gespeichert
Zentraler Server · Rev. 12
V12.7.5 · CNC + Konfektion +
Siebdruck + Tiefziehen · zentraler
LAN-Stand.

Personal → Abwesenheit

- 1 Mitarbeiter, Art (Urlaub / Krank / Sonstiges) und Zeitraum wählen, **Eintragen**. Wochenenden werden übersprungen.
- 2 Die Liste zeigt aktuelle Abwesenheiten; **x** löscht einen Eintrag.
- 3 „Auswirkung auf die Produktion“ zeigt, welche Aufträge dadurch später fertig werden.

TIPP

Den Grund (Urlaub/Krank) sehen nur Sie, Ihre Stellvertretung, die GF und der Admin. Alle anderen sehen nur „Abwesend“.

8. System: Maschinen, Kalender, Benutzer

Produktionsplanung
V12.7.5 · Bereiche · Personal

System
Maschinen & Linien · Schichten · Kalender · Benutzer

lead_k1 Abteilungsleiter LAN

Planung Produktion

Planung
Aufträge
Projekte
Personal
System

Server gespeichert
Zentraler Server · Rev. 12
V12.7.5 · CNC + Konfektion +
Siebdruck + Tiefziehen · zentraler
LAN-Stand.

Maschinen & Schichtkalender Benutzer Einstellungen Historie Report

Maschinen & Linien
Jeder Bereich plant auf seinen Maschinen bzw. Linien – wie CNC. Bei Linien gilt: Personenstunden ÷ Besetzung = Durchlaufzeit.

Konfektion 1 - Thomsen 1 Ressource(n) + Maschine + Linie

NAME	TYP	STANDBETRIEB	UMRÜSTEN MIN	BESETZUNG	PERSONAL/SCHICHT
Linie Konfektion 1 - Thomsen	Linie	1-schichtig	0	1	0

Schichtkalender · Abweichungen
Der Standardbetrieb steht oben bei der Maschine. Hier nur Abweichungen für eine KW oder ein ganzes Jahr.

Maschine / Linie	Gilt für	Jahr	KW	Betrieb
Linie Konfektion 1 - Thomsen	eine KW	2026	40	1-schichtig

Regel speichern

Keine Sonderregeln.

Maschinenstillstand / Wartung
Zeitfenster gelten nur für die gewählte Maschine und werden vollständig aus der planbaren Kapazität entfernt.

Maschine	Von	Bis	Grund
Linie Konfektion 1 - Thon	mm/dd/yyyy, --:-- --	mm/dd/yyyy, --:-- --	z. B. Wartung / Störung

+ Sperrzeit

Keine maschinenspezifischen Sperrzeiten.

System → Maschinen & Schichtkalender

Maschinen & Linien

- Name, Typ (Maschine/Linie), Standardbetrieb (0-, 1-, 2-schichtig), Umrüsten (Minuten), Besetzung (nur Linien) und Personal je Schicht (Mindestbesetzung).
- + Maschine / + Linie legt eine neue Ressource an, × entfernt sie – nur ohne offene Aufträge.

Schichtkalender · Abweichungen

Abweichender Betrieb für eine Maschine für **eine KW** oder ein **ganzes Jahr** (z. B. 2-schichtig in KW 42): Maschine, „Gilt für“, Jahr, KW, Betrieb → Regel speichern.

Maschinenstillstand / Wartung

Maschine, Von, Bis und Grund eintragen → + Sperrzeit. In diesem Zeitraum wird nichts eingeplant.

Benutzer

Im Reiter **Benutzer** legt die Leitung Konten für Stellvertretung und Lesende des eigenen Bereichs an, die Stellvertretung nur Lesende. Passwörter mindestens 8 Zeichen. Leitungskonten legt der Admin an.

Benutzer & Rechte

Zentrale Benutzerkonten auf dem Windows-Host. Passwörter werden serverseitig gehasht gespeichert.

Adresse für Benutzer: http://127.0.0.1:18999

Die IP-Adresse des Windows-Hosts kann direkt verwendet werden. Für einen dauerhaft gleichen Link empfiehlt sich eine feste IP bzw. DHCP-Reservierung.

Benutzer

Passwort

Rolle

Bereich (bei Abteilungsrolle)

z. B. Produktion01

mind. 8 Zeichen

Stellv. Abteilungsleiter

Konfektion 1 – Thomsen

**Benutzer
anlegen**

Admin: Vollzugriff · **GF:** unternehmensweite Übersicht, Personalfreigaben und Betriebsferien · **Abteilungsleiter/Stellvertretung:** volle operative Rechte im eigenen Bereich; Leitung verwaltet Stellvertretungen + Lesende, Stellvertretung nur Lesende (Leitungskonten nur durch Admin) · **Projektmanagement:** AB/FS/WT + Entwicklung, keine manuelle Produktionsressourcenplanung · **Vertrieb:** erfasst Eingänge, meldet Annahme/Verlust · **Arbeitsvorbereitung:** legt Aufträge/Arbeitsgänge in allen Bereichen an und plant sie (keine Freigabe, Produktion, Personal, Einstellungen) · **Lesend:** ausschließlich Ansicht.

► Kurzanleitung: Benutzer hinzufügen

System → Benutzer

9. Begriffe

Begriff	Bedeutung
FS	Fertigungsauftrag – ein Auftrag im Wochenplan einer Maschine oder Linie.
AB	Auftragsbestätigung des Kunden. Ab der Übergabe an die Produktion Pflicht am Projekt.
WT	Projekt- bzw. Bestellnummer des Kunden.
AV-Termin	„Fertig bis“-Termin, den die Arbeitsvorbereitung vorgibt. Früher fertig ist immer erlaubt, später nicht.
Sollstunden	Geplante Arbeitszeit. Bei Linien Personenstunden: $\text{Durchlaufzeit} = \text{Sollstunden} \div \text{Besetzung}$.
Freigabe	Friert den Plan eines Auftrags ein (Maschine, Zeiten, Umrüstzeit, Besetzung). Erst danach kann die Produktion starten.
Historie	Fertig gemeldete oder abgebrochene Aufträge mit Ist-Zeiten und Mengen. Wird nie verändert.
Personal-Gate	Wenn EIN: Freigabe und Start nur mit ausreichend eingeplanter Personal. Wenn AUS: nur Anzeige.

10. Häufige Meldungen und Hilfe

Meldung / Code	Was tun?
MP-PLAN-062 · Termin liegt nach dem AV-Termin	Früher planen oder die Arbeitsvorbereitung bitten, den AV-Termin zu verschieben.
MP-PLAN-056/057/058 · Freigabe außerhalb Schicht, Sperrzeit oder Kollision	Im Wochenplan einen freien Zeitraum in der Schicht wählen ( Termin) und erneut freigeben.
MP-PLAN-032 · Freigegebener Auftrag ist eingefroren	Zuerst die Freigabe zurücknehmen (), dann ändern.
MP-PROD-002 · Nur während der Arbeitszeit	Start/Fortsetzen geht nur innerhalb der Schicht der Maschine.
MP-PERS-025 · Keine Freigabe für die Maschine	Unter Personal → Mitarbeiter die Maschinen-Freigabe setzen.
MP-SYNC-001 · Revision veraltet	Jemand hat gleichzeitig gespeichert. Das Programm lädt neu; Änderung ggf. wiederholen.
MP-AUTH-018 · Ansicht nicht freigegeben	Diese Ansicht gehört nicht zu Ihrer Rolle.
Verbindung weg / „nicht gespeichert“	Netzwerk prüfen, Seite neu laden. Bleibt es, den Admin informieren.

Die vollständige Liste aller Codes steht in **FEHLERCODES.txt** im Programmordner (beim Admin).
