

PRODUKTIONSPLANUNG · ANLEITUNG

Gesamtüberblick Geschäftsführung

Alles auf einen Blick: Abläufe, Rollen, Kennzahlen, Entscheidungen

FÜR WEN

Geschäftsführung.

Programmversion V12.7.5 · Stand 30.09.2026 · Die Bildschirmfotos zeigen erfundene Beispieldaten.

Inhalt

1. Grundlagen: Anmelden, Speichern, Meldungen
2. Der Gesamtablauf
3. Rollen und Rechte
4. GF-Übersicht
5. Auswertung & Nachkalkulation
6. Abwesenheiten und Leiharbeiter
7. Mitarbeiterereinsatz je KW
8. Abteilungen anlegen und pflegen
9. Projekte, Report, Feiertage
10. Was die Bereiche tun (Kurzüberblick)
11. Begriffe
12. Häufige Meldungen und Hilfe

1. Grundlagen: Anmelden, Speichern, Meldungen

Die Produktionsplanung läuft im Browser (Edge, Chrome oder Firefox). Auf dem PC muss nichts installiert werden.

- 1 Browser öffnen und die Adresse eingeben, die der Admin nennt, z. B. **http://192.168.10.89:8765**.
 - 2 Benutzername und Passwort eingeben, .
 - 3 Oben rechts stehen Ihr Name und Ihre Rolle. Links sehen Sie nur die Bereiche, die Ihre Rolle nutzen darf.
- **Passwort ändern:** oben rechts , aktuelles und zweimal das neue Passwort (mind. 8 Zeichen). Andere angemeldete Geräte dieses Kontos werden dabei abgemeldet.
 - **Abmelden:** oben rechts . An gemeinsam genutzten PCs immer abmelden – dabei werden die im Browser zwischengespeicherten Daten gelöscht.
 - **Speichern:** Jede Änderung wird sofort auf dem Server gespeichert. Unten links steht dann „Server gespeichert“.
 - **Mehrere Benutzer gleichzeitig:** Änderungen anderer erscheinen nach wenigen Sekunden automatisch. Haben zwei Personen gleichzeitig gespeichert, gleicht das Programm ab und meldet sich, falls das nicht möglich ist.

WICHTIG

Fehlermeldungen bestehen aus Klartext und einem Code, z. B.

MP-PLAN-031

. Bei Rückfragen immer Code, Auftrag (FS/AB) und Uhrzeit nennen. Meldung „Client-Version veraltet“ (MP-SYNC-002): die Seite mit + neu laden.

TIPP

Nach 8 falschen Passwörtern ist die Anmeldung von diesem PC für 10 Minuten gesperrt.

2. Der Gesamtablauf

- 1 **Projektmanagement** legt das Projekt an, plant Aufgaben aller Abteilungen, gibt dem Kunden den Kundenplan (Excel) und übergibt nach Annahme mit AB + Liefertermin.
- 2 **Arbeitsvorbereitung** legt je Bereich die FS mit AV-Termin an und plant die Fertigungsaufgaben.
- 3 **Bereiche** (CNC, Konfektion, Siebdruck, Tiefziehen) planen fein, teilen Personal ein, geben frei, starten und melden fertig.
- 4 Fertig gemeldete Aufträge landen mit Ist-Zeiten in der **Historie** → Monatsreport und Nachkalkulation.
- 5 **GF** überwacht Termine, Personal und Kapazität, genehmigt Leiharbeiter und setzt Mitarbeiter per KW in anderen Bereichen ein.


3. Rollen und Rechte

Rolle	Sieht	Darf ändern
Admin	alles	alles inkl. Benutzer, Einstellungen, Backup-Import
GF	GF-Übersicht, Projekte, Historie, Report, System (Abteilungen, Feiertage)	Leiharbeiter genehmigen/ablehnen, KW-Einsatz, Feiertage/Betriebsferien, Abteilungen anlegen/umbenennen/deaktivieren
Abteilungsleitung	eigener Bereich: Planung, Aufträge, Produktion, Personal, System; Projekte, Historie, Report	Feinplanung, Freigabe, Produktion, Personal, Maschinen, Schichtkalender, Stillstand; Stellvertretung + Lesende anlegen
Stellv. Abteilungsleitung	wie Leitung	wie Leitung; nur Lesende anlegen
Arbeitsvorbereitung	Planung und Aufträge aller Bereiche, Projekte, Historie, Report	FS anlegen/ändern/löschen (geplant), AV-Termin, Fertigungsabläufe, „Produktion fertig“
Projektmanagement	Projekte, Historie, Report	Projekte, Aufgaben, Termine, Kundenplan, Übergabe, PM-Abläufe
Vertrieb	Projekte, Report	Kundendaten bis zur Annahme, Status der Vertriebs-Aufgaben
Lesend	Planung, Aufträge, Projekte, Personal, Historie, Report	nichts

Den **Abwesenheitsgrund** (Urlaub/Krank/Sonstiges) sehen nur Admin, GF und die Leitung/Stellvertretung des Bereichs, in dem der Mitarbeiter eingesetzt ist – der Server blendet ihn für alle anderen aus.

Anleitungen je Rolle: CNC, Konfektion, Siebdruck, Tiefziehen, Arbeitsvorbereitung, Projektmanagement, Vertrieb.

4. GF-Übersicht

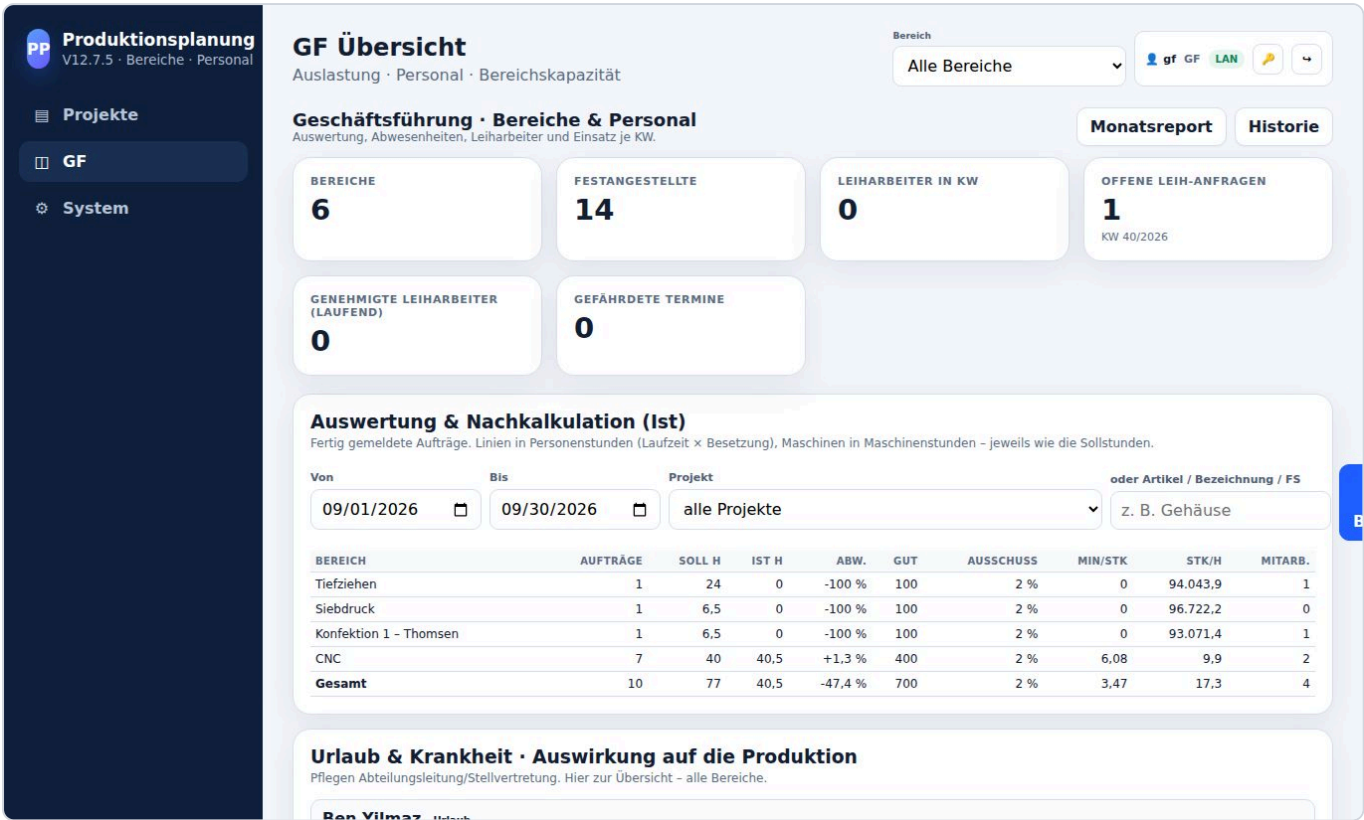

GF-Übersicht (Start der GF)

- Kacheln: Bereiche, Festangestellte, Leiharbeiter in der KW, offene Leih-Anfragen, genehmigte Leiharbeiter, gefährdete Termine.
- Monatsreport und Historie oben rechts.

5. Auswertung & Nachkalkulation

Auswertung & Nachkalkulation (Ist)

Fertig gemeldete Aufträge. Linien in Personenstunden (Laufzeit × Besetzung), Maschinen in Maschinenstunden – jeweils wie die Sollstunden.

Von	Bis	Projekt	oder Artikel / Bezeichnung / FS						
09/01/2026	09/30/2026	alle Projekte	z. B. Gehäuse						
BEREICH	AUFTRÄGE	SOLL H	IST H	ABW.	GUT	AUSSCHUSS	MIN/STK	STK/H	MITARB.
Tiefziehen	1	24	0	-100 %	100	2 %	0	94.043,9	1
Siebdruck	1	6,5	0	-100 %	100	2 %	0	96.722,2	0
Konfektion 1 – Thomsen	1	6,5	0	-100 %	100	2 %	0	93.071,4	1
CNC	7	40	40,5	+1,3 %	400	2 %	6,08	9,9	2
Gesamt	10	77	40,5	-47,4 %	700	2 %	3,47	17,3	4

Auswertung & Nachkalkulation (Ist)

- 1 Zeitraum (Von/Bis), Projekt oder Suchbegriff (Artikel, Bezeichnung, FS) wählen.
- 2 Tabelle je Bereich: Aufträge, Soll h, Ist h, Abweichung, Gut, Ausschuss, Minuten je Stück, Stück je Stunde, Mitarbeiter.
- 3  PDF-Bericht erzeugt die Nachkalkulation im Firmen-CI mit allen Aufträgen und Mitarbeiterstunden.

TIPP

Ist = gemeldete Laufzeit ohne Pausen und Schichtlücken, bei Linien × Besetzung. Soll = Sollstunden + Umrüstzeit. Abweichungen über 10 % sind hervorgehoben.

6. Abwesenheiten und Leiharbeiter

Urlaub & Krankheit · Auswirkung auf die Produktion

Pflegen Abteilungsleitung/Stellvertretung. Hier zur Übersicht – alle Bereiche.

Ben Yilmaz Urlaub

05.10. – 09.10. · 5 Arbeitstag(e) · CNC

Gina Wolf Krank

06.10. · 1 Arbeitstag(e) · Konfektion 1 – Thomsen

Später fertig durch Abwesenheit

Personal-Gate ist AUS: Abwesenheiten verschieben keine Aufträge (nur Anzeige der Unterbesetzung im Wochenplan).

Urlaub & Krankheit aller Bereiche mit Auswirkung auf die Produktion

Leiharbeiter-Anfragen

Abteilungen fragen Leiharbeiter mit Zeitraum an. Erst nach Genehmigung zählen sie in Planung und Kapazität – nur im Zeitraum.

Leih: Olga Brandt 05.10.–23.10. · angefragt

Konfektion 1 – Thomsen · 15 AT · angefragt von —

Notiz (optional)

Genehmigen

Ablehnen

Leiharbeiter-Anfragen

- 1 Anfragen der Bereiche stehen mit Zeitraum und Arbeitstagen unter **Leiharbeiter-Anfragen**.
- 2 Optional Notiz, dann **Genehmigen** oder **Ablehnen**. Genehmigte zählen nur im Zeitraum.

7. Mitarbeiterereinsatz je KW

Mitarbeiterereinsatz dieser KW
Jeder Mitarbeiter existiert genau einmal. Hier wird nur der Einsatzbereich der gewählten KW geändert; die Stammb Abteilung bleibt bestehen.

Anna Keller Festangestellt · Stamm CNC	CNC
Ben Yilmaz Festangestellt · Stamm CNC	CNC
Carla Schmidt Festangestellt · Stamm CNC	CNC
Deniz Aydin Festangestellt · Stamm CNC	CNC
Elif Kaya Festangestellt · Stamm CNC	CNC
Frank Otto Festangestellt · Stamm Konfektion 1 – Thomsen	Konfektion 1 – Thomsen
Gina Wolf Festangestellt · Stamm Konfektion 1 – Thomsen	Konfektion 1 – Thomsen
Hans Berg Festangestellt · Stamm Konfektion 1 – Thomsen	Konfektion 1 – Thomsen
Ivo Petrov Festangestellt · Stamm Konfektion 2 – Keller	Konfektion 2 – Keller
Jana Klein Festangestellt · Stamm Konfektion 2 – Keller	Konfektion 2 – Keller
Kai Neumann Festangestellt · Stamm Siebdruck	Siebdruck
Lea Fuchs Festangestellt · Stamm Tiefziehen	Tiefziehen
Milan Horvat Festangestellt · Stamm Tiefziehen	Tiefziehen
Nora Vogel Festangestellt · Stamm CNC	CNC
Leih: Olga Brandt Leiharbeiter · Stamm Konfektion 1 – Thomsen	Konfektion 1 – Thomsen

Mitarbeiterereinsatz dieser KW

Jeder Mitarbeiter existiert genau einmal. Hier wählen Sie für die **gewählte KW** den Einsatzbereich (z. B. CNC-Mitarbeiter hilft in Konfektion). Die Stammb Abteilung bleibt. Der aufnehmende Bereich plant die Person in dieser KW ein; sie darf dort jede Linie/Maschine bedienen.

Auftragsübersicht je Bereich	
CNC FS-26-S101 · DMG DMU 65 FS-26-S103 · DMG DMU 65 FS-26-S105 · Mazak VCN FS-26-S110 · AB-26-304 · WT-704 · Hermle C42 FS-26-S121 · Hermle C42	6 MA
Konfektion 1 – Thomsen FS-26-S300 · AB-26-302 · WT-702 · Linie Konfektion 1 – Thomsen	3 MA
Konfektion 2 – Keller FS-26-S106 · AB-26-304 · WT-704 · Linie Konfektion 2 – Keller FS-26-S117 · Linie Konfektion 2 – Keller	2 MA
Konfektion 3 Keine offenen Vorgänge in dieser KW	0 MA
Siebdruck FS-26-S113 · Siebdruck 1 FS-26-S114 · AB-26-304 · WT-704 · Siebdruck 1	1 MA
Tiefziehen FS-26-S108 · AB-26-302 · WT-702 · Tiefziehen 1 FS-26-S116 · AB-26-302 · WT-702 · Tiefziehen 1	2 MA

Auftragsübersicht je Bereich

8. Abteilungen anlegen und pflegen

Abteilungen

Produktionsbereiche anlegen, umbenennen oder deaktivieren (Admin und GF). Maschinen/Linien einer neuen Abteilung legt danach der Admin oder die Abteilungsleitung unten an; die Leitung bekommt ihr Konto im Reiter „Benutzer“.

CNC	3 Maschine(n)/Linie(n) · 6 Mitarbeiter · 10 offene Aufträge	☒ aktiv
Konfektion 1 – Thomsen	1 Maschine(n)/Linie(n) · 4 Mitarbeiter · 1 offene Aufträge	☒ aktiv
Konfektion 2 – Keller	1 Maschine(n)/Linie(n) · 2 Mitarbeiter · 2 offene Aufträge	☒ aktiv
Konfektion 3	1 Maschine(n)/Linie(n) · 0 Mitarbeiter · 0 offene Aufträge	☒ aktiv
Siebdruck	1 Maschine(n)/Linie(n) · 1 Mitarbeiter · 4 offene Aufträge	☒ aktiv
Tiefziehen	1 Maschine(n)/Linie(n) · 2 Mitarbeiter · 2 offene Aufträge	☒ aktiv

Neue Abteilung

+ Abteilung

System → Maschinen & Schichtkalender → Abteilungen

- 1 System öffnen, Reiter **Maschinen & Schichtkalender**, Bereich **Abteilungen**.
- 2 **Neue Abteilung:** Namen eintragen (z. B. „Lackierung“) → . Der Name muss eindeutig sein.
- 3 **Umbenennen:** Namen in der Liste ändern – wird sofort gespeichert und überall angezeigt.
- 4 **Deaktivieren:** Haken „aktiv“ entfernen. Geht nur ohne offene Aufträge und ohne aktive Mitarbeiter mit dieser Stammabteilung; die Zeile zeigt die Zahlen dazu. Wieder aktivieren jederzeit.

Danach richtet der **Admin** im Reiter „Benutzer“ das Konto der Abteilungsleitung ein (Rolle Abteilungsleiter, Bereich = neue Abteilung). Maschinen und Linien legt der Admin oder die neue Leitung unter „Maschinen & Linien“ an (/). Die Abteilung steht dann auch in Projekten als Bereich zur Verfügung.

WICHTIG

Abteilungen werden nicht gelöscht, nur deaktiviert – Benutzer, Historie und Projekte verweisen weiter darauf.

9. Projekte, Report, Feiertage

pp

Produktionsplanung

V12.7.5 · Bereiche · Personal

Projekte

GF

System

Server gespeichert

Zentraler Server · Rev. 24

V12.7.5 · CNC + Konfektion + Siebdruck + Tiefziehen · zentraler LAN-Stand.

Projekte

Projektmanagement → Produktion

Bereich

Alle Bereiche

gf GF LAN

Projekte

Projektmanagement legt Projekte an und plant sie · „An Produktion übergeben“ · Arbeitsvorbereitung plant die FS, der Produktionsstand kommt automatisch · „Produktion fertig“.

Suche Projekt, AB, Kunde

☐ Abgeschlossene/Verlorene

PROJEKTMANAGEMENT 3

P-2026-1040

Bosch Rexroth · Gehäuse

Termin 10.10.26

P-2026-1041

Festo · Abdeckung

Termin 12.10.26

P-2026-1048

Stihl · Verkleidung

Termin 04.12.26 · Prozesse 0/2

Kalkulation Projektmanagement

ARBEITSVORBEREITUNG 2

AB-26-303 P-2026-1043

Trumpf · Schutzhaube

Termin 16.10.26 FS 0 0 %

AB-26-305 P-2026-1045

Liebherr · Frontblende

Termin 20.11.26 FS 0 0 %

IN PRODUKTION 2

AB-26-302 P-2026-1042

Krones · Halterung

Termin 14.10.26 FS 7 13 %

AB-26-304 P-2026-1044

Voith · Trägerplatte

Termin 18.11.26 FS 5 62 %

PRODUZIERT 0

Server gespeichert

Zentraler Server · Rev. 24

V12.7.5 · CNC + Konfektion + Siebdruck + Tiefziehen · zentraler LAN-Stand.

Projekte-Tafel (GF liest)

pp

Produktionsplanung

V12.7.5 · Bereiche · Personal

Projekte

GF

System

Server gespeichert

Zentraler Server · Rev. 24

V12.7.5 · CNC + Konfektion +

Monatsreport

Ist-Fertigstellungen · Vorjahresvergleich

Bereich

Alle Bereiche

gf GF LAN

Monatsreport

Nur feste Historie; spätere Plan-/Schichtänderungen verändern die Vergangenheit nicht.

BERICHTSZEITRAUM

September 2026

Erstellt: 30.09.2026, 11:02

Monat

2026-09

☒ Vorjahr

PDF/Druck

FERTIGE AUFTRÄGE

10

neu

SOLLSTUNDEN

77 h

neu

GUTMENGE

700

neu

AUSSCHUSS

14

neu

Abgeschlossene Aufträge

FS-26-4900 · AB-26-306 · WT-706

DMG DMU 65 · 6 h

Gut 50 · Ausschuss 0

Mo., 14.09., 06:30 → Mo., 14.09., 14:00

FS-26-4901 · AB-26-306 · WT-706

DMG DMU 65 · 6 h

Gut 50 · Ausschuss 1

Di., 15.09., 06:30 → Di., 15.09., 14:00

FS-26-4902

DMG DMU 65 · 6 h

Gut 50 · Ausschuss 2

Mi., 16.09., 06:30 → Mi., 16.09., 14:00

FS-26-4903

DMG DMU 65 · 6 h

Gut 50 · Ausschuss 0

Do., 17.09., 06:30 → Do., 17.09., 14:00

FS-26-4904

DMG DMU 65 · 6 h

Gut 50 · Ausschuss 1

Fr., 18.09., 06:30 → Fr., 18.09., 14:00

FS-26-4905

DMG DMU 65 · 6 h

Gut 50 · Ausschuss 2

Sa., 19.09., 06:30 → Sa., 19.09., 14:00

FS-26-5100 · AB-26-302 · WT-702

Hermle C42 · 4 h

Gut 100 · Ausschuss 2

Mi., 30.09., 11:01 → Mi., 30.09., 11:01

FS-26-5118 · AB-26-304 · WT-704

Linie Konfektion 1 - Thomsen · 6,5 h

Gut 100 · Ausschuss 2

Mi., 30.09., 11:01 → Mi., 30.09., 11:01

FS-26-5104 · AB-26-302 · WT-702

Siebdruck 1 · 6,5 h

Gut 100 · Ausschuss 2

Mi., 30.09., 11:02 → Mi., 30.09., 11:02

FS-26-5102 · AB-26-304 · WT-704

Tiefziehen 1 · 24 h

Gut 100 · Ausschuss 2

Mi., 30.09., 11:02 → Mi., 30.09., 11:02


Monatsreport

Feiertage & Betriebsferien pflegen GF und Admin unter System → Arbeitszeiten & Feiertage: Datum, Bezeichnung, Betrieb (0/1/2-schichtig) → + Tag. Gilt für alle Maschinen und Linien.

Gesamtüberblick Geschäftsführung · Produktionsplanung


Seite 11 von 14

10. Was die Bereiche tun (Kurzüberblick)

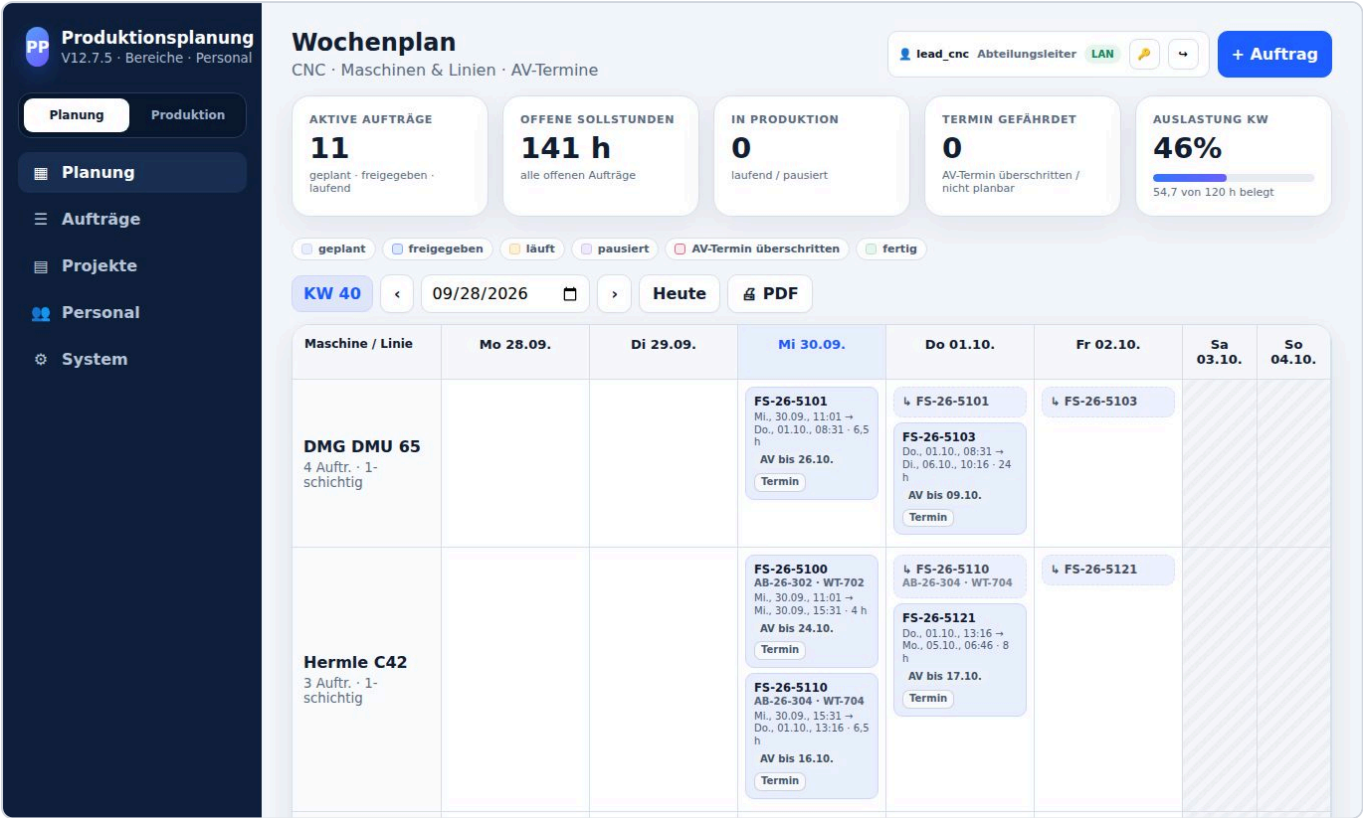

Wochenplan eines Bereichs (CNC)

- Wochenplan: Aufträge je Maschine/Linie; rot = AV-Termin wird überschritten.
- Freigabe friert den Plan ein; Produktion: Start, Pause, Fertig mit Gut/Ausschuss, Abbruch mit Grund.
- Personal: Einteilung je Tag, Abwesenheiten, Leiharbeiter-Anfragen.

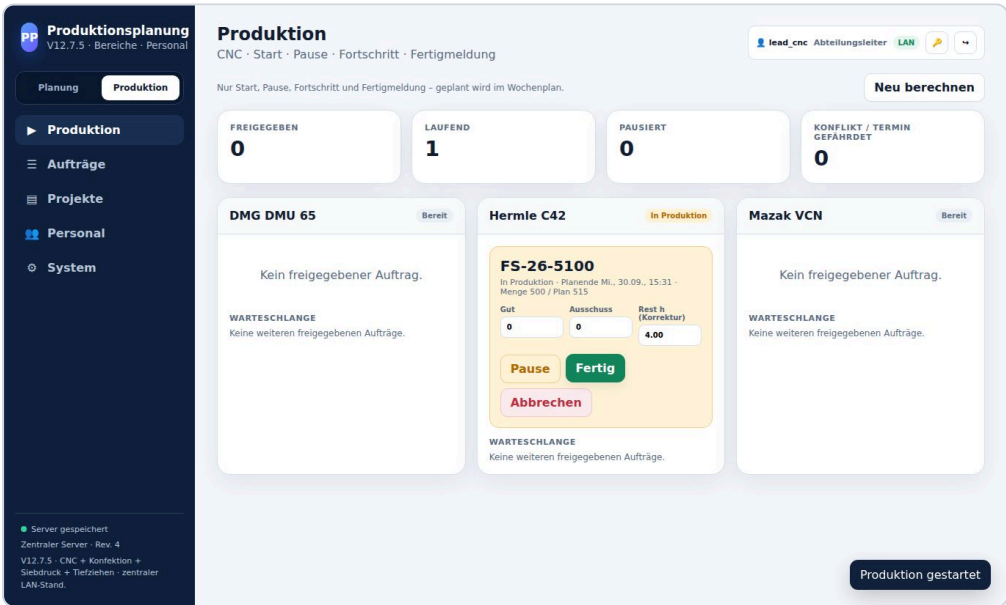

Produktion: laufender Auftrag

11. Begriffe

Begriff	Bedeutung
FS	Fertigungsauftrag – ein Auftrag im Wochenplan einer Maschine oder Linie.
AB	Auftragsbestätigung des Kunden. Ab der Übergabe an die Produktion Pflicht am Projekt.
WT	Projekt- bzw. Bestellnummer des Kunden.
AV-Termin	„Fertig bis“-Termin, den die Arbeitsvorbereitung vorgibt. Früher fertig ist immer erlaubt, später nicht.
Sollstunden	Geplante Arbeitszeit. Bei Linien Personenstunden: $\text{Durchlaufzeit} = \text{Sollstunden} \div \text{Besetzung}$.
Freigabe	Friert den Plan eines Auftrags ein (Maschine, Zeiten, Umrüstzeit, Besetzung). Erst danach kann die Produktion starten.
Historie	Fertig gemeldete oder abgebrochene Aufträge mit Ist-Zeiten und Mengen. Wird nie verändert.
Personal-Gate	Wenn EIN: Freigabe und Start nur mit ausreichend eingeplanter Personal. Wenn AUS: nur Anzeige.

12. Häufige Meldungen und Hilfe

Meldung / Code	Was tun?
MP-PLAN-062 · Termin liegt nach dem AV-Termin	Früher planen oder die Arbeitsvorbereitung bitten, den AV-Termin zu verschieben.
MP-PLAN-056/057/058 · Freigabe außerhalb Schicht, Sperrzeit oder Kollision	Im Wochenplan einen freien Zeitraum in der Schicht wählen ( Termin) und erneut freigeben.
MP-PLAN-032 · Freigegebener Auftrag ist eingefroren	Zuerst die Freigabe zurücknehmen (), dann ändern.
MP-PROD-002 · Nur während der Arbeitszeit	Start/Fortsetzen geht nur innerhalb der Schicht der Maschine.
MP-PERS-025 · Keine Freigabe für die Maschine	Unter Personal → Mitarbeiter die Maschinen-Freigabe setzen.
MP-SYNC-001 · Revision veraltet	Jemand hat gleichzeitig gespeichert. Das Programm lädt neu; Änderung ggf. wiederholen.
MP-AUTH-018 · Ansicht nicht freigegeben	Diese Ansicht gehört nicht zu Ihrer Rolle.
Verbindung weg / „nicht gespeichert“	Netzwerk prüfen, Seite neu laden. Bleibt es, den Admin informieren.

Die vollständige Liste aller Codes steht in **FEHLERCODES.txt** im Programmordner (beim Admin).
