

PRODUKTIONSPLANUNG · ANLEITUNG

Anleitung Arbeitsvorbereitung

Aufträge anlegen, AV-Termine, Fertigungsabläufe

FÜR WEN

Mitarbeitende der Arbeitsvorbereitung (AV).

Inhalt

1. Grundlagen: Anmelden, Speichern, Meldungen
2. Ihre Rolle
3. Neuen Auftrag (FS) anlegen
4. Aufträge pflegen
5. Projekte nach der Übergabe
6. Historie und Report
7. Begriffe
8. Häufige Meldungen und Hilfe

1. Grundlagen: Anmelden, Speichern, Meldungen

Die Produktionsplanung läuft im Browser (Edge, Chrome oder Firefox). Auf dem PC muss nichts installiert werden.

- 1 Browser öffnen und die Adresse eingeben, die der Admin nennt, z. B. **http://192.168.10.89:8765**.
 - 2 Benutzername und Passwort eingeben, .
 - 3 Oben rechts stehen Ihr Name und Ihre Rolle. Links sehen Sie nur die Bereiche, die Ihre Rolle nutzen darf.
- **Passwort ändern:** oben rechts , aktuelles und zweimal das neue Passwort (mind. 8 Zeichen). Andere angemeldete Geräte dieses Kontos werden dabei abgemeldet.
 - **Abmelden:** oben rechts . An gemeinsam genutzten PCs immer abmelden – dabei werden die im Browser zwischengespeicherten Daten gelöscht.
 - **Speichern:** Jede Änderung wird sofort auf dem Server gespeichert. Unten links steht dann „Server gespeichert“.
 - **Mehrere Benutzer gleichzeitig:** Änderungen anderer erscheinen nach wenigen Sekunden automatisch. Haben zwei Personen gleichzeitig gespeichert, gleicht das Programm ab und meldet sich, falls das nicht möglich ist.

WICHTIG

Fehlermeldungen bestehen aus Klartext und einem Code, z. B.

MP-PLAN-031

. Bei Rückfragen immer Code, Auftrag (FS/AB) und Uhrzeit nennen. Meldung „Client-Version veraltet“ (MP-SYNC-002): die Seite mit + neu laden.


TIPP

Nach 8 falschen Passwörtern ist die Anmeldung von diesem PC für 10 Minuten gesperrt.

2. Ihre Rolle

Die **Arbeitsvorbereitung (AV)** legt die Fertigungsaufträge (FS) in allen Bereichen an, gibt mit dem **AV-Termin** vor, bis wann sie fertig sein müssen, verknüpft sie mit Projekten (AB) und plant die Fertigungsabläufe der Projekte.

- **Darf:** FS anlegen, ändern und löschen, solange sie geplant sind; AV-Termin setzen; Projekte nach der Übergabe planen und „Produktion fertig“ melden; eigene AV-Abläufe speichern.
- **Darf nicht:** freigeben, Produktion melden, Personal, Maschinen oder Einstellungen ändern – das machen die Bereiche bzw. der Admin.

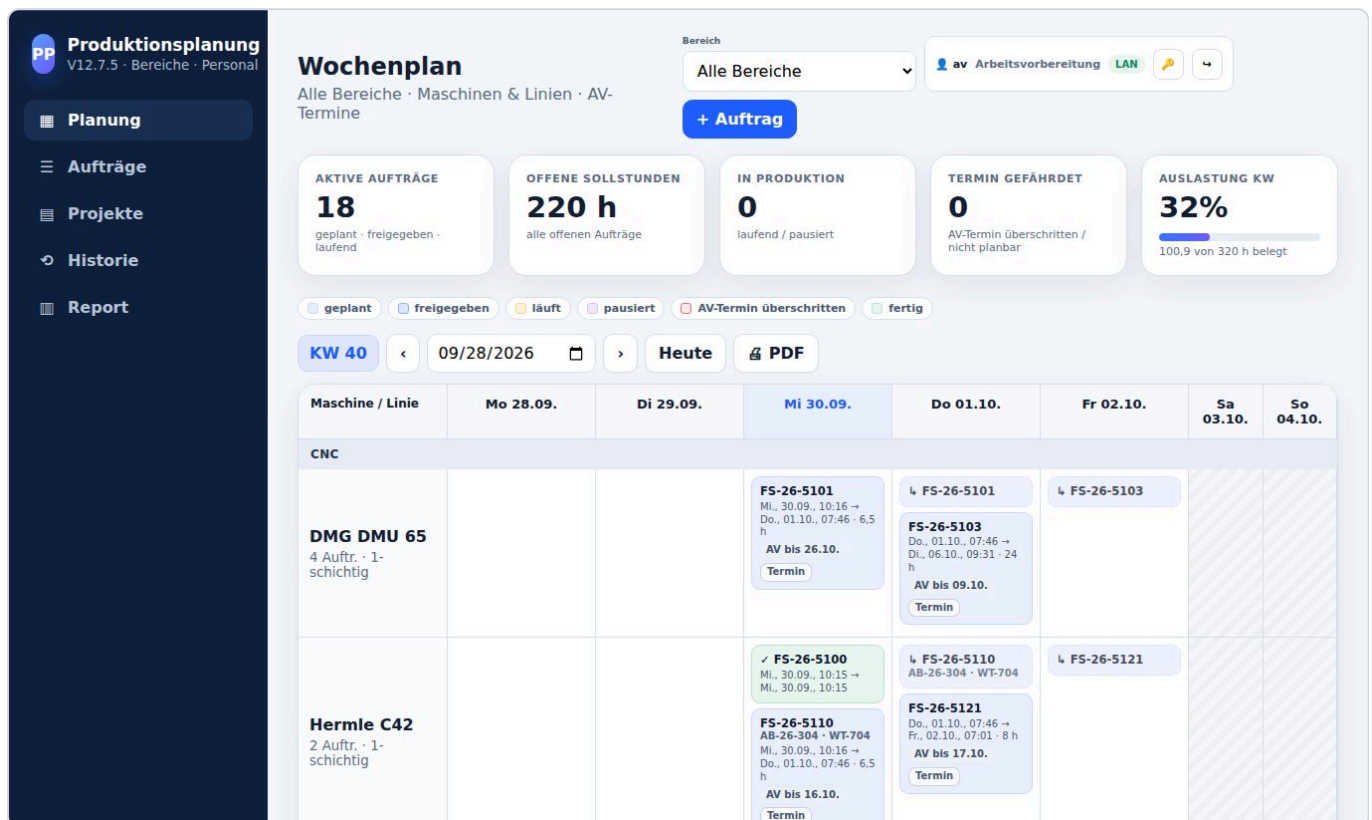

Startansicht der AV: Wochenplan aller Bereiche

TIPP

Oben unter

BEREICH

auf einen Bereich einschränken; „Alle Bereiche“ zeigt alles.

3. Neuen Auftrag (FS) anlegen

- 1 **+ Auftrag** (oben) bzw. unter Aufträge **+ Neuer Auftrag**.
- 2 **Bereich** und **Maschine / Linie** wählen.
- 3 **FS** (Pflicht) eintragen, bei Bedarf **Projekt / AB** wählen – AB und WT werden dann übernommen.
- 4 Artikel/Beschreibung, Menge und **Sollstunden** (Pflicht). Bei Taktfertigung: Takt, Teile je Takt und Rüsten eintragen und **→ Sollstunden**.
- 5 **AV-Termin · fertig bis** setzen. Optional Alternative Maschine, Planart und Starttermin.
- 6 **Anlegen** – der Auftrag wird automatisch frühestmöglich eingeplant.

Neuer Auftrag

Bereich: Konfektion 1 - Thomsen
Linie: Linie Konfektion 1 - Thomsen

FS - Fertigungsauftrag *: FS-26-5300
Projekt / AB: AB-26-302 · WT-702 · Krones

Artikel / Beschreibung: Halter montiert
WT / Projektnummer: WT-702

Menge (Stk): 200
Personenstunden *: 12
≈ 12 h Durchlauf bei 1 Personen

AV-Termin · fertig bis: 10/16/2026
Abteilung plant fein - früher ist ok, später wird rot.

Planart: Auto · frühestmöglich

Starttermin: mm/dd/yyyy, --:-- --

Abbrechen Anlegen

Dialog Neuer Auftrag

WICHTIG

Wird der Auftrag erst nach dem AV-Termin fertig, meldet das Programm das sofort (MP-PLAN-063) und die Karte wird rot. Dann mit dem Bereich sprechen, Priorität ändern oder den Termin anpassen.

PP

Produktionsplanung

V12.7.5 · Bereiche · Personal

Planung

Aufträge

Projekte

Historie

Report

Aufträge

Alle Bereiche · Priorität per Ziehen oder ↑/↓ · AV-Termin

Bereich

Alle Bereiche

av

Arbeitsvorbereitung

LAN

Auftragsliste

Reihenfolge = Priorität (ziehen oder ↑/↓). Rot = AV-Termin wird überschritten.

← Projekte

+ Neuer Auftrag

Auftrag suchen ...

Alle Maschinen / Linien

Alle Status

☐ nur Konflikte

	PRIOR	AUFTRAG	MASCHINE / LINIE	SOLL H	MENGE	AV-TERMIN	PLAN	STATUS	AKTION
...	#1	FS-26-5101 ohne AB - CNC Grundplatte Alu	DMG DMU 65 Alternative: keine	6.5	500	10/26/2026	Mi., 30.09., 10:16 bis Do., 01.10., 07:46	Geplant	⌂ ▶ ✕
...	#2	FS-26-5103 ohne AB - CNC Deckel PC	DMG DMU 65 Alternative: keine	24	50	10/09/2026	Do., 01.10., 07:46 bis Di., 06.10., 09:31	Geplant	⌂ ▶ ✕
...	#3	FS-26-5105 ohne AB - CNC Winkel Stahl	Mazak VCN Alternative: keine	24	120	10/11/2026	Mi., 30.09., 10:16 bis Mo., 05.10., 11:46	Geplant	⌂ ▶ ✕
...	#4	FS-26-5106 AB-26-304 - WT-704 Konfektion 2 - Keller Winkel Stahl	Linie Konfektion : Pers.-h - 1 P.	4	500	10/25/2026	Mi., 30.09., 10:16 bis Mi., 30.09., 14:46	Geplant	⌂ ▶ ✕
...	#5	FS-26-5107 ohne AB - CNC Folie bedruckt	DMG DMU 65 Alternative: keine	24	120	10/11/2026	Di., 06.10., 09:31 bis Fr., 09.10., 07:01	Geplant	⌂ ▶ ✕
...	#6	FS-26-5108 AB-26-302 - WT-702 Tiefziehen Grundplatte Alu	Tiefziehen 1	16	120	10/27/2026	Mi., 30.09., 10:16 bis Fr., 02.10., 08:31	Geplant	⌂ ▶ ✕
...	#7	FS-26-5109	Mazak VCN	12	500	10/23/2026	Mo., 05.10.,	Geplant	⌂ ▶ ✕

Produktionsauftrag angelegt

Nach dem Anlegen: Auftrag im Wochenplan

4. Aufträge pflegen

- Planung → Aufträge: Maschine, Sollstunden, Menge und **AV-Termin** direkt in der Zeile ändern.
- Nur **geplante** Aufträge können geändert oder gelöscht werden. Freigegebene, laufende und fertige gehören dem Bereich.
- Einen AV-Termin, der vor einem schon gesetzten Start- oder Fertigtermin liegt, lehnt das Programm ab (MP-PLAN-062).
- Priorität (Reihenfolge) legt der Bereich fest; die AV kann sie ebenfalls ziehen.

5. Projekte nach der Übergabe

Produktionsplanung
V12.7.5 · Bereiche · Personal

Projekte
Projektmanagement → Produktion

Bereich: **Alle Bereiche**

Projekte
Projektmanagement legt Projekte an und plant sie - „An Produktion übergeben“ - Arbeitsvorbereitung plant die FS, der Produktionsstand kommt automatisch - „Produktion fertig“.

Suche Projekt, AB, Kunde ☐ Abgeschlossene/Verlorene **Aufträge →**

PROJEKTMANAGEMENT	ARBEITSVORBEREITUNG	IN PRODUKTION	PRODUZIERT
P-2026-1040 Bosch Rexroth · Gehäuse Termin 10.10.26	AB-26-303 P-2026-1043 Trumpf · Schutzhaube Termin 16.10.26 FS 0 0 %	AB-26-302 P-2026-1042 Krones · Halterung Termin 14.10.26 FS 7 13 %	—
P-2026-1041 Festo · Abdeckung Termin 12.10.26	AB-26-305 P-2026-1045 Liebherr · Frontblende Termin 20.11.26 FS 0 0 %	AB-26-304 P-2026-1044 Voith · Trägerplatte Termin 18.11.26 FS 5 62 %	—

► **Gespeicherte Prozessabläufe**

● Server gespeichert
Zentraler Server · Rev. 23
V12.7.5 · CNC + Konfektion +
Siebdruck + Tiefziehen · zentraler
LAN-Stand.

Projekte-Tafel: Spalte „Arbeitsvorbereitung“ = an die Produktion übergeben

- 1 Projekt in der Spalte **Arbeitsvorbereitung** öffnen.
- 2 Im Abschnitt **Produktion**: gespeicherten **AV-Ablauf** wählen, Startdatum (vorwärts) oder Enddatum (rückwärts) und **Anwenden** – oder Aufgaben einzeln mit Bereich, Start und Fällig anlegen.
- 3 Für Fertigungsaufgaben die FS anlegen: **Als Auftrag einplanen** oder **+ Auftrag** mit Projekt/AB.
- 4 Der Fortschritt „In Produktion / Produziert“ kommt automatisch aus den FS.
- 5 Sind alle FS fertig: **Produktion fertig** schließt das Projekt ab.

The screenshot shows a project window for 'P-2026-1043 · AB AB-26-303' (Trumpf - Schutzhaube - WT WT-703). It features a progress bar for 'Entwicklung & Vertrieb' (1/6) and 'Produktion'. A 'Kundenplan' section indicates no customer plan is exported, with an 'Excel herunterladen' button. A 'Notiz zum Schritt (optional)' field and a 'Produktion fertig' button are also present. The main section, '1 Entwicklung & Vertrieb', shows a timeline of tasks: 'Konstruktion freigeben' (21.09. - 25.09.), 'Material bestellen' (28.09. - 02.10.), '3 PARALLEL' tasks ('Fräsen' - 05.10. - 09.10., 'Schale tiefziehen' - 06.10. - 07.10., 'Bedrucken' - 07.10. - 08.10.), and 'Konfektion' (12.10. - 16.10.). At the bottom, there's an 'Ablauf' section with a dropdown for 'Gespeicherten Ablauf wählen ...', a date selector 'ab 09/30/2026', and buttons for 'Anwenden', 'Name für neuen Ablauf', and 'Als Ablauf speichern'.

Projekt-Fenster mit Kundenplan-Vergleich und Produktion

TIPP

Der KUNDENPLAN

(vom PM an den Kunden gegeben) wird mit Ihrer Planung verglichen: „ Δ x AT“ zeigt Verzug gegenüber dem Kunden, „✓ Puffer“ ist in Ordnung.

Eigene Fertigungsabläufe: im Projekt einen Namen eintragen und **Als Ablauf speichern**. Bereiche, Aufgaben und Terminabstände werden gemerkt.

6. Historie und Report

- **Historie:** alle fertig gemeldeten und abgebrochenen Aufträge mit Ist-Zeiten. Ältere Einträge unter „Ältere Historie (Archiv)“ nachladen.
- **Report:** Monatsreport mit Anzahl, Sollstunden, Gutmenge und Ausschuss; [PDF/Druck](#).

7. Begriffe

Begriff	Bedeutung
FS	Fertigungsauftrag – ein Auftrag im Wochenplan einer Maschine oder Linie.
AB	Auftragsbestätigung des Kunden. Ab der Übergabe an die Produktion Pflicht am Projekt.
WT	Projekt- bzw. Bestellnummer des Kunden.
AV-Termin	„Fertig bis“-Termin, den die Arbeitsvorbereitung vorgibt. Früher fertig ist immer erlaubt, später nicht.
Sollstunden	Geplante Arbeitszeit. Bei Linien Personenstunden: $\text{Durchlaufzeit} = \text{Sollstunden} \div \text{Besetzung}$.
Freigabe	Friert den Plan eines Auftrags ein (Maschine, Zeiten, Umrüstzeit, Besetzung). Erst danach kann die Produktion starten.
Historie	Fertig gemeldete oder abgebrochene Aufträge mit Ist-Zeiten und Mengen. Wird nie verändert.
Personal-Gate	Wenn EIN: Freigabe und Start nur mit ausreichend eingeplanter Personal. Wenn AUS: nur Anzeige.

8. Häufige Meldungen und Hilfe

Meldung / Code	Was tun?
MP-PLAN-062 · Termin liegt nach dem AV-Termin	Früher planen oder die Arbeitsvorbereitung bitten, den AV-Termin zu verschieben.
MP-PLAN-056/057/058 · Freigabe außerhalb Schicht, Sperrzeit oder Kollision	Im Wochenplan einen freien Zeitraum in der Schicht wählen ( Termin) und erneut freigeben.
MP-PLAN-032 · Freigegebener Auftrag ist eingefroren	Zuerst die Freigabe zurücknehmen (), dann ändern.
MP-PROD-002 · Nur während der Arbeitszeit	Start/Fortsetzen geht nur innerhalb der Schicht der Maschine.
MP-PERS-025 · Keine Freigabe für die Maschine	Unter Personal → Mitarbeiter die Maschinen-Freigabe setzen.
MP-SYNC-001 · Revision veraltet	Jemand hat gleichzeitig gespeichert. Das Programm lädt neu; Änderung ggf. wiederholen.
MP-AUTH-018 · Ansicht nicht freigegeben	Diese Ansicht gehört nicht zu Ihrer Rolle.
Verbindung weg / „nicht gespeichert“	Netzwerk prüfen, Seite neu laden. Bleibt es, den Admin informieren.

Die vollständige Liste aller Codes steht in **FEHLERCODES.txt** im Programmordner (beim Admin).
